CJYR
ADECUACIONES Y OBRAS

PLANNING COMERCIAL PRODUCCION
DISTRITO ESTUDIO ADH ( MADRID )
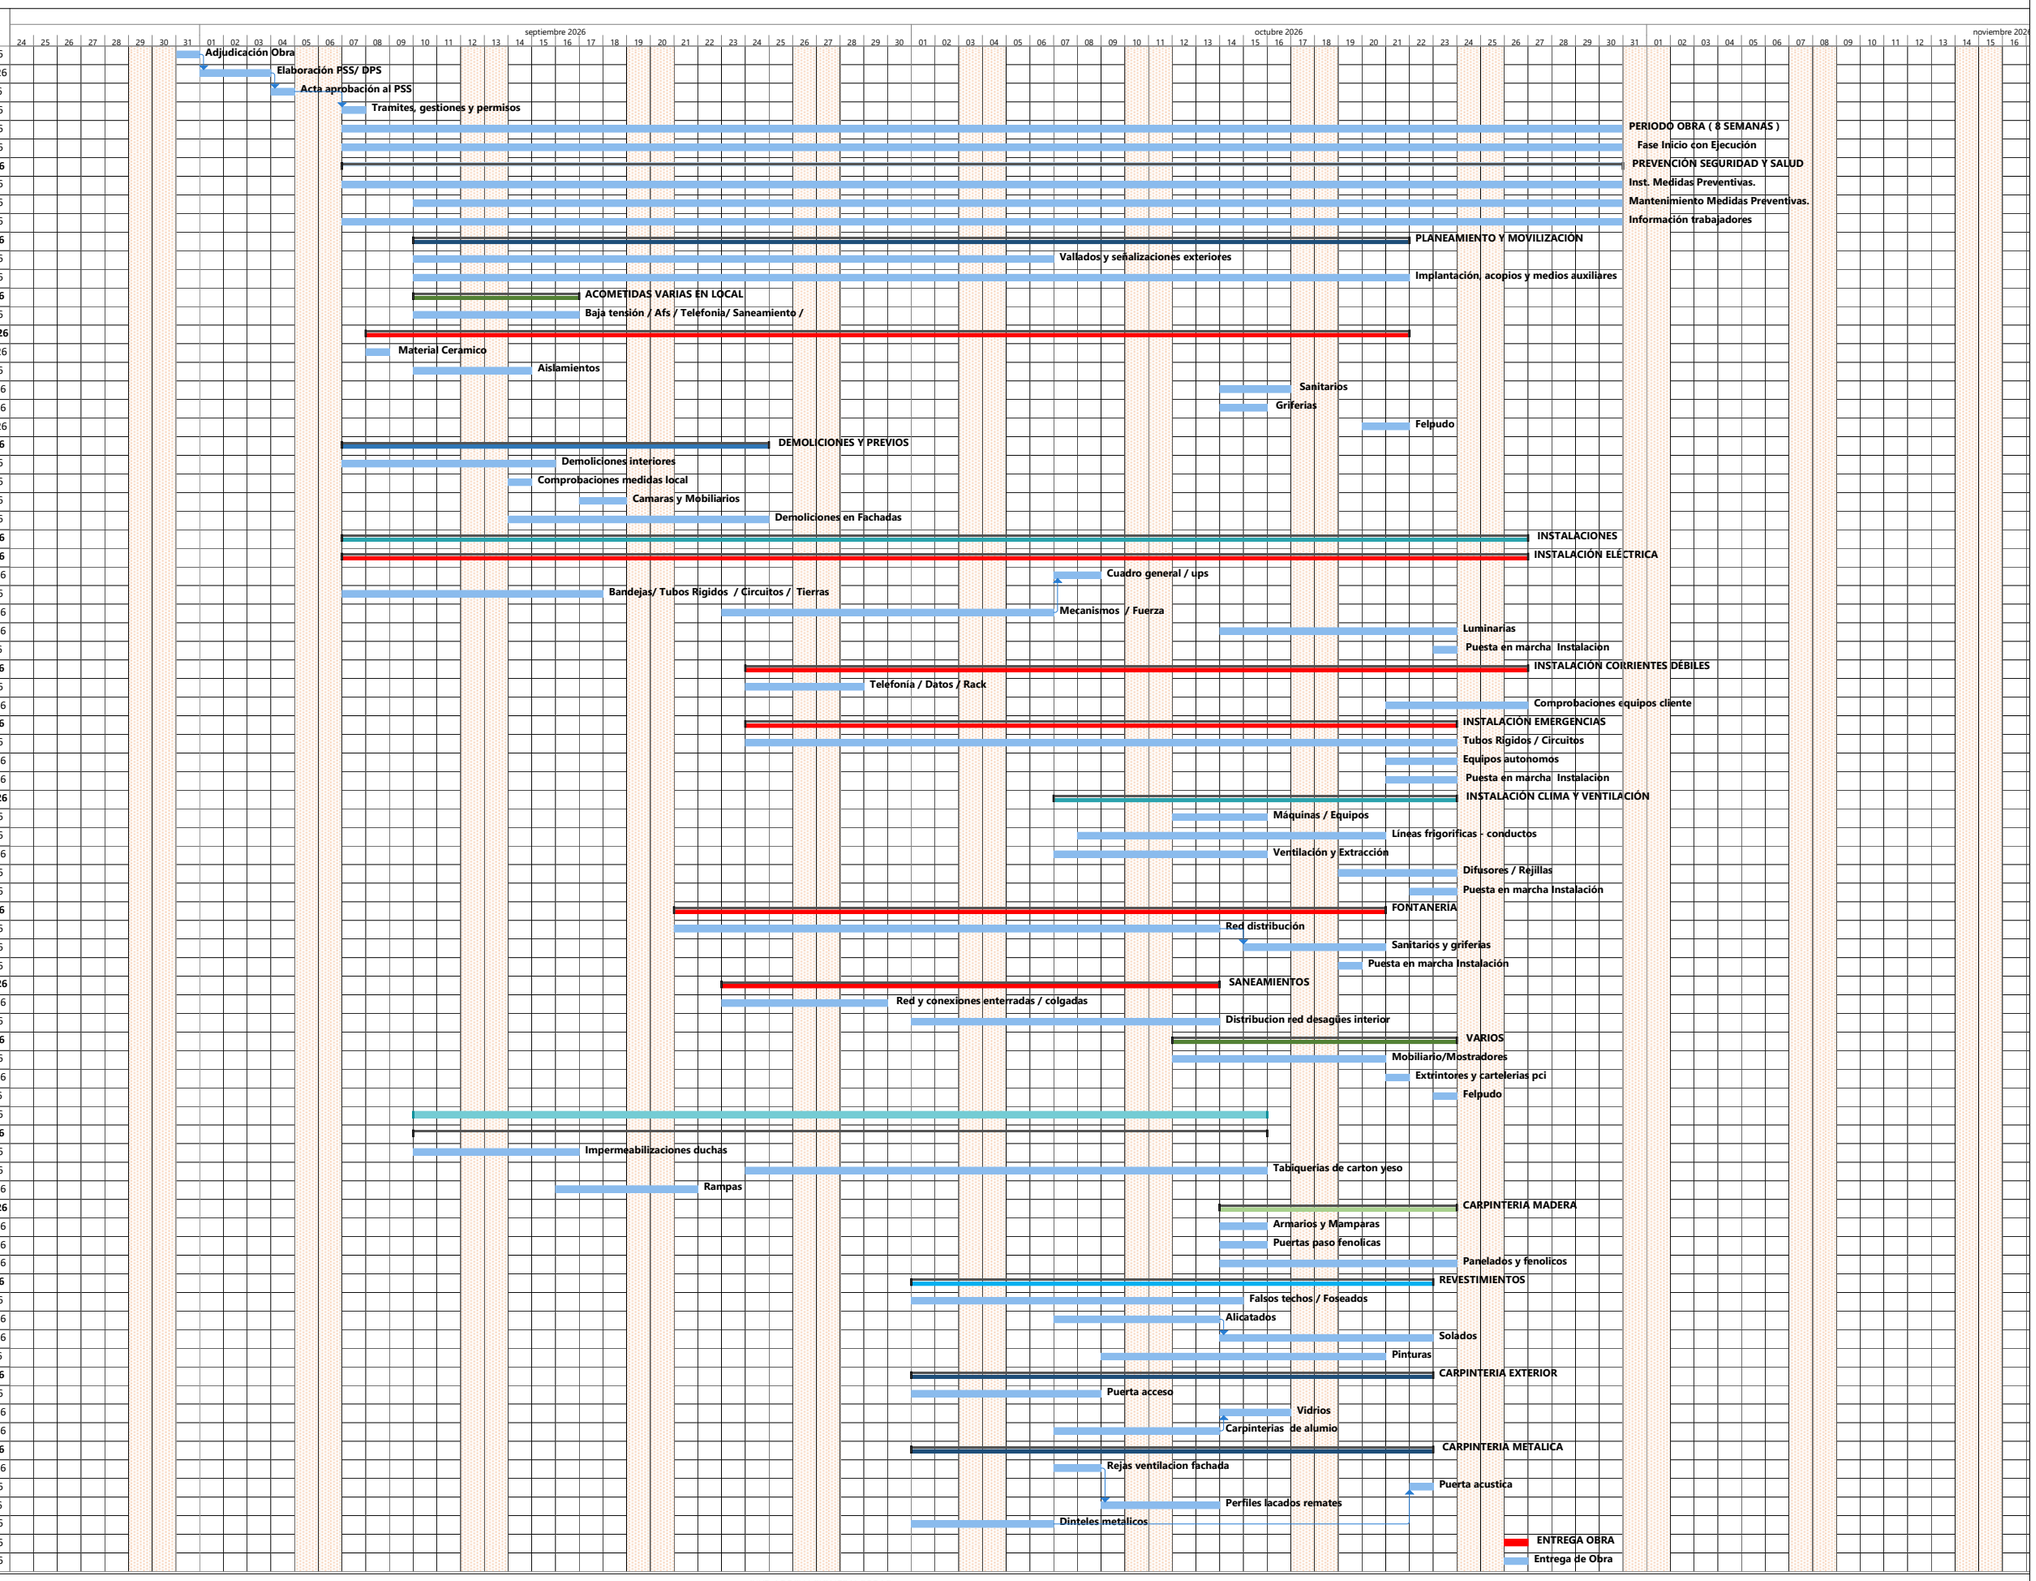
| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo |
|---|---|---|---|
| 1 | **Adjudicación Obra** | 1 día? | lun 31/08/26 |
| 2 | **Elaboración PSS/ DPS** | 3 días? | mar 01/09/26 |
| 3 | **Acta aprobación al PSS** | 1 día? | vie 04/09/26 |
| 4 | **Tramites, gestiones y permisos** | 1 día? | lun 07/09/26 |
| 5 | **PERIODO OBRA ( 8 SEMANAS )** | 40 días? | lun 07/09/26 |
| 6 | **Fase Inicio con Ejecución** | 40 días? | lun 07/09/26 |
| 7 | **PREVENCIÓN SEGURIDAD Y SALUD** | **40 días? lun 07/09/26** | |
| 8 | **Inst. Medidas Preventivas.** | 40 días? | lun 07/09/26 |
| 9 | **Mantenimiento Medidas Preventivas.** | 37 días? | jue 10/09/26 |
| 10 | **Información trabajadores** | 40 días? | lun 07/09/26 |
| 11 | **PLANEAMIENTO Y MOVILIZACIÓN** | **30 días? jue 10/09/26** | |
| 12 | **Vallados y señalizaciones exteriores** | 19 días? | jue 10/09/26 |
| 13 | **Implantación, acopios y medios auxiliares** | 30 días? | jue 10/09/26 |
| 14 | **ACOMETIDAS VARIAS EN LOCAL** | **5 días? jue 10/09/26** | |
| 15 | **Baja tensión / Afs / Telefonia/ Saneamiento /** | 5 días? | jue 10/09/26 |
| 16 | **HITOS SUMINISTROS** | **32 días? mar 08/09/26** | |
| 17 | **Material Ceramico** | 1 día? | mar 08/09/26 |
| 18 | **Aislamientos** | 3 días? | jue 10/09/26 |
| 19 | **Sanitarios** | 3 días? | mié 14/10/26 |
| 20 | **Griferias** | 2 días? | mié 14/10/26 |
| 21 | **Felpudo** | 2 días? | mar 20/10/26 |
| 22 | **DEMOLICIONES Y PREVIOS** | **14 días? lun 07/09/26** | |
| 23 | **Demoliciones interiores** | 7 días? | lun 07/09/26 |
| 24 | **Comprobaciones medidas local** | 1 día? | lun 14/09/26 |
| 25 | **Camaras y Mobiliarios** | 2 días? | jue 17/09/26 |
| 26 | **Demoliciones en Fachadas** | 9 días? | lun 14/09/26 |
| 27 | **INSTALACIONES** | **36 días? lun 07/09/26** | |
| 28 | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | **36 días? lun 07/09/26** | |
| 29 | Cuadro general / ups | 2 días? | mié 07/10/26 |
| 30 | Bandejas/ Tubos Rigidos / Circuitos / Tierras | 9 días? | lun 07/09/26 |
| 31 | Mecanismos / Fuerza | 10 días? | mié 23/09/26 |
| 32 | Luminarias | 8 días? | mié 14/10/26 |
| 33 | **Puesta en marcha Instalacion** | 1 día? | vie 23/10/26 |
| 34 | **INSTALACIÓN CORRIENTES DÉBILES** | **23 días? jue 24/09/26** | |
| 35 | Telefonía / Datos / Rack | 3 días? | jue 24/09/26 |
| 36 | **Comprobaciones equipos cliente** | 4 días? | mié 21/10/26 |
| 37 | **INSTALACIÓN EMERGENCIAS** | **22 días? jue 24/09/26** | |
| 38 | Tubos Rigidos / Circuitos | 22 días? | jue 24/09/26 |
| 39 | Equipos autonomos | 3 días? | mié 21/10/26 |
| 40 | **Puesta en marcha Instalacion** | 3 días? | mié 21/10/26 |
| 41 | **INSTALACIÓN CLIMA Y VENTILACIÓN** | **13 días? mié 07/10/26** | |
| 42 | Máquinas / Equipos | 4 días? | lun 12/10/26 |
| 43 | Líneas frigorificas - conductos | 9 días? | jue 08/10/26 |
| 44 | Ventilación y Extracción | 7 días? | mié 07/10/26 |
| 45 | Difusores / Rejillas | 5 días? | lun 19/10/26 |
| 46 | **Puesta en marcha Instalación** | 2 días? | jue 22/10/26 |
| 47 | **FONTANERÍA** | **22 días? lun 21/09/26** | |
| 48 | Red distribución | 17 días? | lun 21/09/26 |
| 49 | Sanitarios y griferias | 4 días? | jue 15/10/26 |
| 50 | **Puesta en marcha Instalación** | 1 día? | lun 19/10/26 |
| 51 | **SANEAMIENTOS** | **15 días? mié 23/09/26** | |
| 52 | Red y conexiones enterradas / colgadas | 5 días? | mié 23/09/26 |
| 53 | Distribucion red desagües interior | 9 días? | jue 01/10/26 |
| 54 | **VARIOS** | **10 días? lun 12/10/26** | |
| 55 | **Mobiliario/Mostradores** | 7 días? | lun 12/10/26 |
| 56 | **Extrintores y cartelerias pci** | 1 día? | mié 21/10/26 |
| 57 | **Felpudo** | 1 día? | vie 23/10/26 |
| 58 | **ALBAÑILERIAS** | 26 días | jue 10/09/26 |
| 59 | **Insonorizaciones** | **26 días? jue 10/09/26** | |
| 60 | **Impermeabilizaciones duchas** | 5 días? | jue 10/09/26 |
| 61 | **Tabiquerias de carton yeso** | 16 días? | jue 24/09/26 |
| 62 | **Rampas** | 4 días? | mié 16/09/26 |
| 63 | **CARPINTERIA MADERA** | **8 días? mié 14/10/26** | |
| 64 | **Armarios y Mamparas** | 2 días? | mié 14/10/26 |
| 65 | **Puertas paso fenolicas** | 2 días? | mié 14/10/26 |
| 66 | **Panelados y fenolicos** | 8 días? | mié 14/10/26 |
| 67 | **REVESTIMIENTOS** | **16 días? jue 01/10/26** | |
| 68 | **Falsos techos / Foseados** | 10 días? | jue 01/10/26 |
| 69 | **Alicatados** | 5 días? | mié 07/10/26 |
| 70 | **Solados** | 7 días? | mié 14/10/26 |
| 71 | **Pinturas** | 8 días? | vie 09/10/26 |
| 72 | **CARPINTERIA EXTERIOR** | **16 días? jue 01/10/26** | |
| 73 | **Puerta acceso** | 6 días? | jue 01/10/26 |
| 74 | **Vidrios** | 3 días? | mié 14/10/26 |
| 75 | **Carpinterias de alumio** | 5 días? | mié 07/10/26 |
| 76 | **CARPINTERIA METALICA** | **16 días? jue 01/10/26** | |
| 77 | **Rejas ventilacion fachada** | 2 días? | mié 07/10/26 |
| 78 | **Puerta acustica** | 1 día? | jue 22/10/26 |
| 79 | **Perfiles lacados remates** | 3 días? | vie 09/10/26 |
| 80 | **Dinteles metalicos** | 4 días? | jue 01/10/26 |
| 81 | **ENTREGA OBRA** | 1 día? | lun 26/10/26 |
| 82 | **Entrega de Obra** | 1 día? | lun 26/10/26 |
